

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: GP-PLA-INF-001
	PROCESO: Gestión de Proyectos	VERSIÓN: 1.0
	PLANIFICACIÓN DE PROYECTO	ELABORACIÓN: 18/03/2026
	Informe de Planificación del Proyecto Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 18/03/2026

1. Título

Informe de Planificación del Proyecto Proformax

2. Introducción

El presente Informe de Planificación establece la hoja de ruta técnica y operativa para el desarrollo e implementación de **Proformax**, la aplicación web orientada a la automatización y gestión centralizada de proformas para la microempresa Arte Parquet G&G.

Este documento tiene como propósito principal traducir los objetivos, el alcance y las directrices previamente aprobadas en el Acta de Constitución (GP-INI-ACT-001) en un plan de acción estructurado y medible. A través de este informe, se articula la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) y se traza el cronograma preliminar de actividades, definiendo las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue necesarias para culminar el sistema dentro del plazo estimado de 14 semanas.

Actualmente, el proyecto atraviesa una fase de planificación iterativa. Si bien el cronograma adjunto representa una línea base preliminar —donde las fechas exactas de ejecución y la asignación al detalle de los recursos técnicos y humanos por tarea se encuentran en proceso de refinamiento—, este documento actúa como el pilar fundamental para la organización del equipo de WaveDev.

El contenido detallado a continuación servirá como guía directiva para la gestión del tiempo, la comunicación entre los *stakeholders* y la correcta distribución de responsabilidades entre los roles de gestión, arquitectura, desarrollo *front-end*, *back-end*, aseguramiento de calidad (QA) y despliegue, garantizando que el proyecto avance de manera controlada y alineada a las expectativas del cliente.

3. Objetivos de la planificacion

3.1 Objetivo General

Establecer la línea base técnica, operativa y metodológica para la ejecución del proyecto Proformax, definiendo con claridad la secuencia de actividades, estimación de tiempos, asignación de recursos y responsabilidades necesarias para garantizar la entrega del aplicativo web a Arte Parquet G&G dentro del alcance, tiempo (14 semanas) y presupuesto aprobados.

3.2 Objetivos Específicos

- **Definir la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT):** Dividir el alcance total del proyecto en fases, entregables y paquetes de trabajo manejables que faciliten la asignación de tareas al equipo de desarrollo.
- **Establecer el cronograma detallado:** Trazar la secuencia lógica de las actividades, estimar sus duraciones y fijar hitos de control utilizando la herramienta

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: GP-PLA-INF-001
	PROCESO: Gestión de Proyectos	VERSIÓN: 1.0
	PLANIFICACIÓN DE PROYECTO	ELABORACIÓN: 18/03/2026
	Informe de Planificación del Proyecto Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 18/03/2026

de gestión de proyectos (ProjectLibre) como referencia preliminar.

- **Asignar recursos y responsabilidades:** Distribuir las cargas de trabajo de manera eficiente entre los roles de gestión, desarrollo (Front-end, Back-end, Full-stack), aseguramiento de calidad y despliegue del equipo WaveDev.
- **Fijar mecanismos de control:** Determinar cómo se medirá el avance técnico del proyecto y cómo se gestionará la comunicación y validación de entregables con los *stakeholders* a lo largo del ciclo de vida del desarrollo.

4. Alcance

Este informe abarca de manera integral la planificación técnica, metodológica y operativa del proyecto Proformax, incluyendo:

- La definición de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), detallando las fases, entregables y paquetes de trabajo necesarios para la construcción e implementación del aplicativo web.
- El establecimiento del cronograma preliminar de actividades, considerando la distribución de las fases desde el inicio hasta el cierre, y la estimación de tiempos para el cumplimiento del plazo de 14 semanas.
- La planificación y asignación estratégica de recursos humanos, distribuyendo las responsabilidades y cargas de trabajo entre los roles técnicos y de gestión del equipo WaveDev.
- La definición de la metodología de desarrollo a emplear, así como la identificación de las herramientas tecnológicas de apoyo para el control del proyecto.
- El establecimiento del plan de gestión de comunicaciones y validación continua entre el equipo ejecutor y los patrocinadores (Arte Parquet G&G).

5. Definiciones

Para asegurar la correcta comprensión técnica, metodológica y comercial de este informe por parte de todos los involucrados (*stakeholders*), se establecen las siguientes definiciones:

- **Aplicación Web:** Sistema informático accesible a través de un navegador de internet (como Google Chrome o Microsoft Edge), que no requiere instalación física en los equipos de la microempresa.
- **Back-end:** Capa interna y lógica del sistema, invisible para el usuario. Es responsable de procesar la información, ejecutar los cálculos automáticos de las cotizaciones y conectar con la base de datos.
- **EDT (Estructura de Desglose del Trabajo):** Herramienta de gestión que consiste en la descomposición jerárquica del alcance total del proyecto en fases, entregables y paquetes de trabajo más pequeños y manejables.
- **Front-end:** Capa visual e interactiva del sistema (interfaz gráfica). Comprende las pantallas, botones y formularios con los que el personal de Arte Parquet G&G

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: GP-PLA-INF-001
	PROCESO: Gestión de Proyectos	VERSIÓN: 1.0
	PLANIFICACIÓN DE PROYECTO	ELABORACIÓN: 18/03/2026
	Informe de Planificación del Proyecto Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 18/03/2026

interactuará diariamente.

- **Hito (Milestone):** Evento o punto de control significativo dentro del cronograma del proyecto, que marca la finalización de una fase importante o la entrega de un módulo clave.
- **Línea Base (*Baseline*):** El plan original aprobado del proyecto (en términos de alcance, tiempo y costo) contra el cual se medirá y controlará el avance real del desarrollo.
- **Proforma:** Documento comercial informativo emitido por el sistema, que detalla la cotización o presupuesto estimado de productos y servicios (ej. instalación de pisos) sin poseer validez tributaria (no es una factura).
- **QA (Quality Assurance / Aseguramiento de Calidad):** Proceso sistemático de revisión y ejecución de pruebas sobre el software para garantizar que funciona correctamente y cumple con los requerimientos acordados antes de su despliegue.
- **Sprint:** Iteración o ciclo corto de trabajo continuo dentro de la metodología de desarrollo, diseñado para entregar un incremento de software funcional y validable en un tiempo determinado.
- **Stakeholder (Parte Interesada):** Cualquier individuo, grupo u organización que puede afectar, verse afectado o percibir que se ve afectado por el desarrollo y los resultados del proyecto.

6. Responsabilidades

Para llevar a cabo la fase de planificación y la elaboración del presente informe de manera estructurada, las cargas de trabajo dentro del equipo de desarrollo de WaveDev se distribuyeron de la siguiente manera:

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: GP-PLA-INF-001
	PROCESO: Gestión de Proyectos	VERSIÓN: 1.0
	PLANIFICACIÓN DE PROYECTO	ELABORACIÓN: 18/03/2026
	Informe de Planificación del Proyecto Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 18/03/2026

Miembro del Equipo	Rol General	Responsabilidad en la Planificación
Giler Rizzo David	Gestor del Proyecto	Lideró la fase de planificación, coordinó las sesiones de trabajo y organizó las tareas del resto de los integrantes del equipo.
Chavez Meneses Michael	Desarrollador Fullstack	Encargado principal de la redacción, estructuración y consolidación técnica del presente Informe de Planificación.
Velastegui Eugenio Paul	Documentador	Encargado de la asignación y distribución de los recursos (tecnológicos, humanos y financieros) dentro de la planificación.
Guangasi Guananga Aracelly	Desarrolladora Front-end	Responsable del desglose de actividades y de la creación del Diagrama de Gantt y cronograma en la herramienta de gestión.

Cuadro 1: Matriz de Responsabilidades durante la Fase de Planificación

7. Método / Políticas / Contenido

7.1 Método

Para la estructuración y ejecución del presente proyecto, se ha determinado que el método de planificación más adecuado es un enfoque híbrido que integra prácticas de gestión predictiva con iteraciones ágiles.

La elección de este marco de trabajo se justifica por su capacidad para alinear los objetivos técnicos del proyecto con las necesidades del negocio. Este método permite mantener un control riguroso sobre el cronograma y la asignación de recursos, ofreciendo al mismo tiempo la flexibilidad necesaria para adaptarse a posibles cambios en los requisitos. Al estructurar la planificación en hitos iterativos, se garantiza una evaluación continua del progreso, facilitando la detección temprana de desviaciones y asegurando que cada entregable cumpla con los criterios de aceptación antes de avanzar a la siguiente etapa.

7.2 Políticas

Para respaldar el método elegido y asegurar la viabilidad del proyecto, la planificación se rige bajo un conjunto de políticas institucionales y técnicas. Estas directrices aseguran la transparencia, la calidad y la reducción de la incertidumbre:

- **Política de Estimación y Tiempos:** Todas las tareas deben ser desglosadas

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: GP-PLA-INF-001
	PROCESO: Gestión de Proyectos	VERSIÓN: 1.0
	PLANIFICACIÓN DE PROYECTO	ELABORACIÓN: 18/03/2026
	Informe de Planificación del Proyecto Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 18/03/2026

y estimadas utilizando técnicas estandarizadas, garantizando la creación de un cronograma realista que evite la sobrecarga del equipo de desarrollo.

- **Política de Gestión de Riesgos:** Se establece como carácter obligatorio la identificación, evaluación y mitigación proactiva de riesgos técnicos, operativos y de negocio. Este proceso se alinea con las directrices de la norma ISO 31000, asegurando márgenes de contingencia específicos para proteger la continuidad del proyecto.
- **Política de Calidad de Entregables:** La planificación integra revisiones de calidad al final de cada ciclo de trabajo. Ninguna fase se considera completada sin la validación formal que certifique que el desarrollo cumple con los atributos de calidad interna, externa y en uso, tomando como marco de referencia el estándar ISO 25010.
- **Política de Comunicación y Reporte:** Se definen canales formales y reuniones periódicas de control para asegurar que todos los interesados (*stakeholders*) estén alineados con el estado del proyecto, los bloqueos existentes y los próximos pasos en el cronograma.

7.3 Contenido de la Planificación

El contenido de la planificación detalla la hoja de ruta operativa del proyecto, estructurando el trabajo en paquetes manejables y estableciendo los tiempos de ejecución para cada hito. Esta estructura permite un seguimiento exhaustivo del ciclo de vida del desarrollo.

1. Estructura de Desglose de Trabajo (WBS)

Para garantizar la cobertura total del alcance, el proyecto se ha descompuesto jerárquicamente en paquetes de trabajo (ver Anexo 1: *Esquema de la Estructura de Desglose de Trabajo*). Esta descomposición facilita la estimación de costos, la asignación de responsabilidades y el control de calidad en cada nivel operativo.

2. Fases del Proyecto y Cronograma

El cronograma general del proyecto se ha definido con una duración total estimada de **[Insertar duración total, ej.: 12 semanas]**, iniciando el **[2/03/2026]** y proyectando su finalización para el **[10/6/2026 fin]**. El desarrollo se divide en las siguientes fases principales:

- **Fase de Inicio y Planificación (14 días):** Levantamiento de requerimientos, análisis de viabilidad y estructuración del alcance.
- **Fase de Diseño (14 días):** Creación de mockups, diseño de la arquitectura del sistema y modelado de bases de datos.
- **Fase de Desarrollo (49 días):** Programación de los módulos del sistema (Frontend y Backend) e integración de componentes.
- **Fase de Pruebas y Control de Calidad (7 días):** Ejecución de pruebas unitarias, de integración y validación de estándares de calidad y seguridad.
- **Fase de Despliegue y Cierre (7 días):** Puesta en producción, entrega de

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: GP-PLA-INF-001
	PROCESO: Gestión de Proyectos	VERSIÓN: 1.0
	PLANIFICACIÓN DE PROYECTO	ELABORACIÓN: 18/03/2026
	Informe de Planificación del Proyecto Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 18/03/2026

manuales y firma de actas de aceptación.

3. Asignación de Recursos

Para el cumplimiento del cronograma, se ha designado un equipo multidisciplinario con responsabilidades específicas en cada fase del proyecto, optimizando la carga de trabajo y garantizando la calidad técnica:

- **Gestor de Proyecto:** Responsable de la supervisión del cronograma, gestión de riesgos y comunicación institucional.
- **Desarrollador Frontend:** Encargado de la implementación de la interfaz de usuario, garantizando la usabilidad y experiencia del usuario final.
- **Equipo Técnico / Backend:** Responsable de la lógica de negocio, arquitectura de datos y seguridad de la información.
- **Control de Calidad (QA):** Encargado de la validación de requerimientos, ejecución de pruebas de estrés y certificación del cumplimiento normativo (ISO 25010).

8. Normativa Legal y Técnica Aplicable

La planificación y ejecución de este proyecto se fundamentan en un marco regulatorio que asegura el estricto cumplimiento de la legislación ecuatoriana vigente, así como en la adopción de estándares técnicos internacionales que garantizan la calidad del producto y la correcta gestión operativa.

8.1 Normativa Legal

- **Código del Trabajo del Ecuador:** Regula la relación contractual e iteraciones laborales entre la entidad desarrolladora y los profesionales involucrados en la planificación y ejecución, garantizando el cumplimiento de jornadas, remuneraciones justas y condiciones laborales adecuadas para el equipo de proyecto.

8.2 Normativa Técnica

- **Estándar Internacional ISO/IEC 25010:** Define el modelo y marco de trabajo para la evaluación de la calidad del producto de software. Su aplicación en la planificación asegura que los entregables cumplan con características fundamentales como adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad.
- **Estándar Internacional ISO 31000:** Proporciona los principios y directrices fundamentales para la gestión de riesgos. Su inclusión garantiza que la planificación cuente con una estructura metódica para la identificación, análisis, evaluación y tratamiento proactivo de las amenazas y vulnerabilidades, salvaguardando la continuidad del proyecto.

9. Firmas de Responsabilidad

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: GP-PLA-INF-001
	PROCESO: Gestión de Proyectos	VERSIÓN: 1.0
	PLANIFICACIÓN DE PROYECTO	ELABORACIÓN: 18/03/2026
	Informe de Planificación del Proyecto Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 18/03/2026

Acción	Nombre y cargo	Firma	Fecha
Elaborado por:	Chávez Meneses Michael Ricardo (Equipo Técnico)		18/03/2026
Revisado por:	Velastegui Eugenio Anthony Paul (Control de Calidad)		18/03/2026
Aprobado por:	Giler Risso Neris David (Gestor de Proyecto)		18/03/2026

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: GP-PLA-INF-001
	PROCESO: Gestión de Proyectos	VERSIÓN: 1.0
	PLANIFICACIÓN DE PROYECTO	ELABORACIÓN: 18/03/2026
	Informe de Planificación del Proyecto Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 18/03/2026

10. Bibliografía

Referencias

- [1] Organización Internacional de Normalización (ISO), *ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*. Ginebra, Suiza: ISO, 2011.
- [2] Organización Internacional de Normalización (ISO), *ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines*. Ginebra, Suiza: ISO, 2018.
- [3] Asamblea Nacional del Ecuador, *Código del Trabajo*. Registro Oficial Suplemento 167, 16 de diciembre de 2005 (Última modificación). Quito, Ecuador.
- [4] Project Management Institute, *Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK)*, 7ma ed. Pensilvania, EE.UU.: PMI, 2021.

11. Anexos

Anexo 1: Estructura de Desglose de Trabajo (WBS)

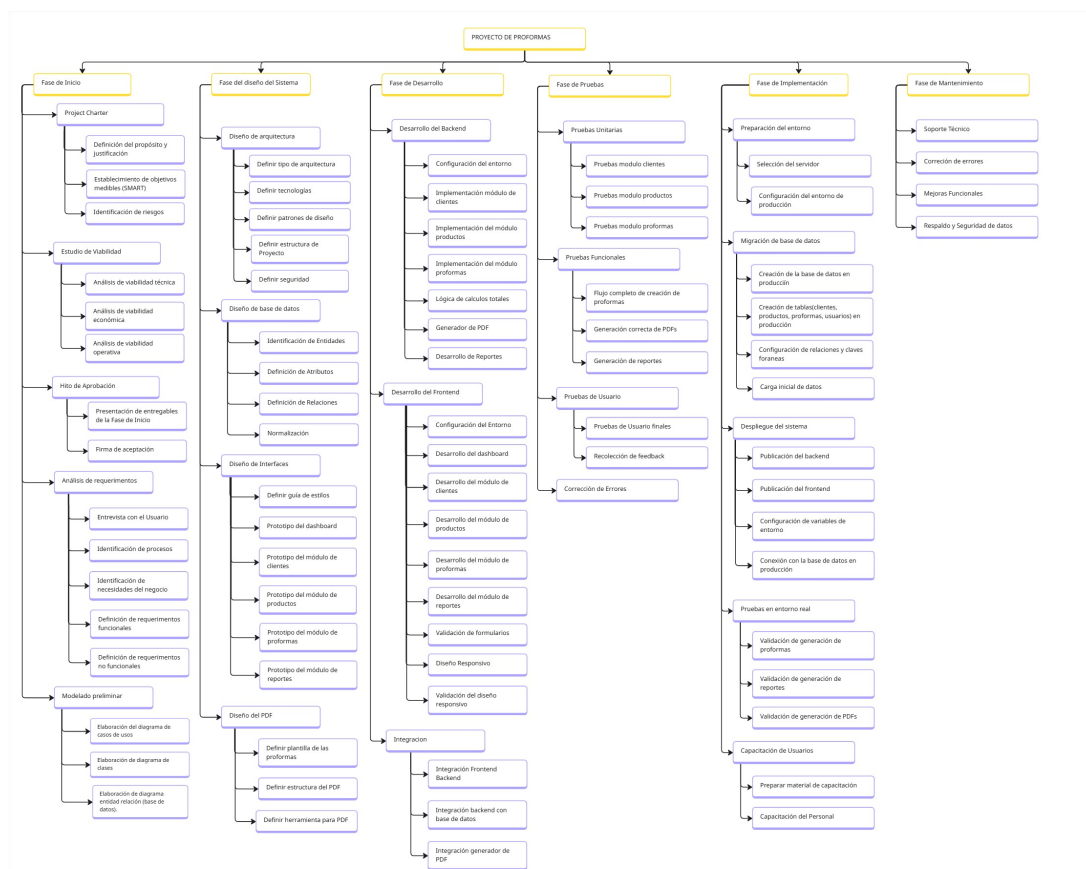


Figura 1: Esquema de la Estructura de Desglose de Trabajo.
